Приложение А.2

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино»
_____ А.Ю. Пыккын
"26" октября 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Лорино»
1.2. Адрес объекта:
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино улица Ленина дом 9; тел/факс 84273693463; mdou-lorino@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее трёхэтажное здание на железобетонных сваях, общей площадью **1996** кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **4 439** кв.м
1.4. Год постройки здания **1986 г.**, последнего капитального ремонта (системы канализации) **2016 г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего:* **2026,** *капитального* **не запланирован**

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино»; МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино улица Ленина дом 9**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): , **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия улица Советская дом 15**

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*
2.1 Сфера деятельности: **образовательная деятельность**
2.2 Виды оказываемых услуг: **реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за детьми в возрасте от полутора лет до прекращения образовательных отношений**
2.3 Форма оказания услуг: **очная**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды детства**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **0**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **пассажирского транспорта нет**,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **общественный транспорт отсутствует, при шаговой доступности к объекту из любой точки населённого пункта**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: нет имеется
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **0** м
3.2.2 время движения (пешком): **0** мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : **нет**
3.2.4 Перекрестки: **нет**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

****** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Лорино, Ленина, дом 9 отсутствуют условия доступности (пешеходные дорожки, пандус, лифт) для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов передвигающихся на креслах – колясках. Для других категорий инвалидов образовательные услуги доступны условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требуется устройство бетонированных, пешеходных дорожек.
2	Вход (входы) в здание	Устройство 2 пандусов на высоту 1,9 метра на входе и на выходе здания. Устройство дверных проёмов 2 основных входов для беспрепятственного доступа инвалидов на креслах-колясках. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Расширение дверных проёмов до требуемых нормативов. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Расширение дверных проёмов до требуемых нормативов. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Обустройство согласно требуемым стандартам. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения Обустройство согласно требуемым стандартам. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется устройство бетонированных, пешеходных дорожек.
8	**Все зоны и участки**	Обустройство согласно требуемым стандартам. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **Требуется принятие технических решений, их согласований на уровне компетентных организаций согласно установленных требований, принятых стандартов. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.**
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации: **Обеспечение условной доступности на объекты образовательного учреждения с помощью сотрудников учреждения, либо с помощью организации альтернативной формы обучения.**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____

4.5. Информация размещена (обновлена) **На официальном сайте МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» mdou-lorino@mail/ru**
(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии: _____ А.Ю. Пыккын

Члены комиссии:
_____ Т.И. Давлеткулова
_____ Д.С. Ульгугье
_____ Г.Г. Кукун

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ «ДС «Солнышко»
с. Лорино»
_____ А.Ю. Пыккын
"26" октября 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

Чукотский автономный округ «26» октября 2026 г.
Чукотский район
село Лорино
Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино»**
1.2.Назначение: **образовательная деятельность**
1.3. Адрес объекта:
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино улица Ленина дом 9
1.4. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее трёхэтажное здание на железобетонных сваях , общей площадью **1996** кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **4 439** кв.м
1.5. Год постройки здания **1986 г.**, последнего капитального ремонта (системы канализации) **2016 г.**
1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2026**, капитального: **не запланирован**
1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино» МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино»**
1.8. Юридический адрес организации (учреждения):
689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино улица Ленина дом 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **МБДОУ «ДС «Солнышко» села Лорино» реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования; присмотр и уход за детьми в возрасте от полутора лет до прекращения образовательных отношений**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Общественный пассажирский транспорт в населённом пункте отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **нет**
3.2.2 время движения (пешком) **нет**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **отсутствует**
3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

****** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требуется устройство бетонированных, пешеходных дорожек.
2	Вход (входы) в здание	Устройство 2 пандусов на высоту 1,9 метра на входе и на выходе здания. Устройство дверных проёмов 2 основных входов для беспрепятственного доступа инвалидов на креслах-колясках. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Расширение дверных проёмов до требуемых нормативов. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Расширение дверных проёмов до требуемых нормативов. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Обустройство согласно требуемым стандартам. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения Обустройство согласно требуемым стандартам. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется устройство бетонированных, пешеходных дорожек.
8.	**Все зоны и участки**	Обустройство согласно требуемым стандартам. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Требуется принятие технических решений, их согласований на уровне компетентных организаций согласно установленных требований, принятых стандартов.

4.2. Период проведения работ: **до 2030 года**

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации:

Отсутствие инвалидов всех категорий. В случае необходимости организация альтернативной формы обслуживания

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Технические решения по реконструкции здания, адаптации объектов, помещений высокозатратны в отсутствии инвалидов всех категорий.

При необходимости - организация альтернативной формы обслуживания

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. **Согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

_____

4.4.2. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.3. **согласование работ с надзорными органами;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).**

4.5. Информация размещена (обновлена) **На официальном сайте МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» mdou-lorino@mail/ru**

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии: _____ А.Ю, Пыккын

Члены комиссии:

_____ Т.И. Давлеткулова

_____ Д.С. Ульгугье

_____ Г.Г. Кукун

Приложение 1


к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «26» октября 2026 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ «ДС «Солнышко» с, Лорино, ЧАО.Чукотский район ул. Ленина д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Калитка (ширина 110 см); норматив не менее 90 см.	К,О,С		ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет		1	Грунтовая дорога с гравийным покрытием. Тротуар отсутствует. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути, визуальная информация. Нет указателей направления движения, нет декоративного ограждения, выполняющее направляющую функцию	К,О,Г,С	Устройство, бетонирование пешеходных дорожек, оборудование тактильными средствами, специальными знаками визуальной информации. Устройство, бетонирование пешеходных дорожек, оборудование тактильными средствами, специальными знаками визуальной информации.	Устройство, бетонирование пешеходных дорожек, оборудование тактильными средствами, специальными знаками визуальной информации. Устройство, бетонирование пешеходных дорожек, оборудование тактильными средствами, специальными знаками визуальной информации.
1.3	Лестница (наружная)	есть		2,3	Фундамент здания на бетонных сваях Крыльцо – бетонная площадка. Наружная лестница высотой 1,9 метра	О,С	Устройство пандуса	Устройство пандуса
1.4	Пандус (наружный)	нет	–	–	отсутствует	К,О,С	Проектирование, создание и установка пандуса с поручнями с двух сторон	Устройство пандуса
1.5	Автостоянка и парковка	нет	–	–	отсутствует	К,О	Отсутствует автостоянка, оборудованная знаком «Инвалид» и разметкой	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Отсутствие оборудованной автостоянки, бетонных тротуаров, пешеходных дорожек, тактильных средств информации, информационных визуальных знаков.	



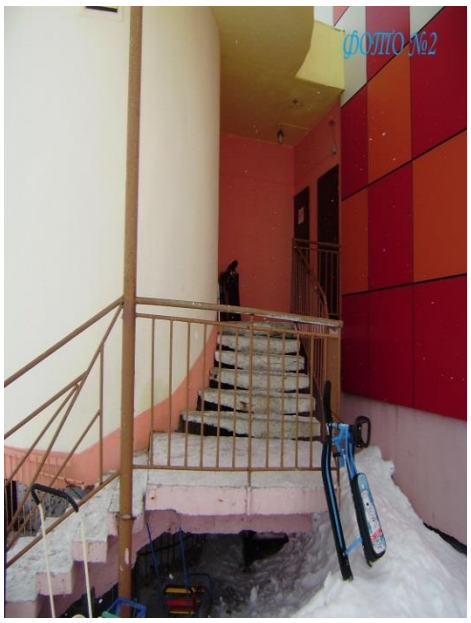



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Общие требования к территории	ДУ		1; 2; 3;	Проектирование, устройство пандуса основного входа, запасного выхода.

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Устройство автостоянки. Устройство пешеходных дорожек. Проектирование, устройство пандусов на высоту крыльца 1,5 метра основного и запасного выходов.

Нанесение тактильных средств, оборудование путей необходимыми информационными знаками

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «26» октября 2026 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «ДС «Солнышко» с, Лорино, ЧАО.Чукотский район ул. Ленина д.9
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница главного входа (наружная)	есть		2	Фундамент здания на бетонных сваях Крыльцо – бетонная площадка. Наружная лестница основного входа высотой 1,9 метра	ДУ	Устройство пандуса	Устройство пандуса
2.2	Лестница со стороны начальной школы	есть		3	Фундамент здания на бетонных сваях Крыльцо – бетонная площадка. Наружная лестница основного входа высотой 2,4 метра	ДУ	Устройство пандуса	Устройство пандуса
2.2	Пандус (наружный)	нет	–		Пандусы со стороны основного входа и со стороны начальной школы отсутствуют	ДУ	Устройство пандуса	Устройство пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Бетонная плита является основанием крыльца на высоте 1,9 метра со стороны основного входа и 2,4 метра со стороны начальной школы	ДУ		
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Дверь главного входа Проём 0,95 метра Проём со стороны начальной школы 1. 09 метра	ДУ		
2.5	Тамбур	есть		6	-габариты тамбура не соответствуют нормативу, имеются пороги	ДУ	Технических решений не имеет	Технических решений не имеет
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход-выход в здание	ДУ		3,4,5,6	Ремонт, реконструкция

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для беспрепятственного доступа необходимо устройство пандусов основного входа и запасного выхода из здания, расширение проёма тамбура запасного выхода, реконструкция дверных проёмов.






Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «26» октября 2026 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «ДС «Солнышко» с, Лорино, ЧАО. Чукотский район ул. Ленина д.9
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов не соответствуют нормативу (фактическая 72-91 см. норматив не менее 120 см.)	К,О С	Увеличить ширину полосы движения при открытых дверях кабинетов, установить навесное оборудование в зоне движения, создать выступ	реконструкция
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		8	- нет рельефной тактильной полосы перед маршем вверху и внизу - нет контрастной окраски первой и последней ступени - нет поручней с двух сторон	С,О	Создать поручни с двух сторон, рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу и контрастную окраску первой и последней ступени	реконструкция
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		8	отсутствует	К	Создание пандуса с поручнями с двух сторон	создание
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		8	отсутствует	К,О	Установка лифта или подъемника	создание
3.5	Дверь	есть		9	- нет дверей распашных - нет автоматических раздвижных дверей	К	Установка автоматических распашных дверей	создание
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		9	На пути эвакуации двери, коридоры, лестницы не соответствуют нормативам. Нет эскалатора, траволатора	К.О.С.	Увеличить ширину полосы движения при открытых дверях кабинетов, установить навесное оборудование в	реконструкция

							зоне движения, создать выступ	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

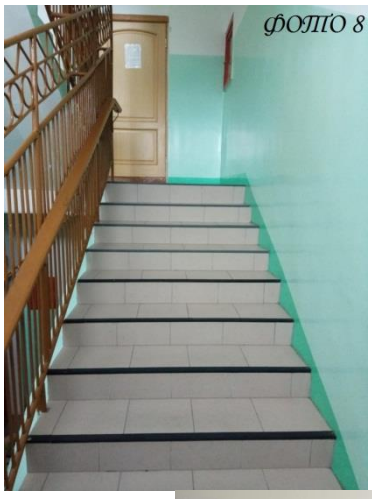





II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД		8,9,10	Реконструкция, создание

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется принятие технических решений, их согласований на уровне компетентных организаций согласно установленных требований, принятых стандартов. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.**

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «26» октября 2026 г

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ «ДС «Солнышко» с, Лорино, ЧАО. Чукотский район ул. Ленина д.9
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		11	- Имеются порожки на всех помещениях; - Нет зоны для кресла коляски; - нет столов с высотой рабочей поверхности	К,О	убрать порожки на всех помещениях; создать зоны для кресла коляски; установить столы с высотой рабочей поверхности	рекон струк ция
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		15, 16	Имеются в наличии музыкальный и спортивный залы -доля мест для колясочников не менее 2 % - имеются порожки - нет мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	К,О,Г	Создание мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	рекон струк ция
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-		Не требуется	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			- Ширина полосы движения не соответствует нормативу - нет соответствующего оборудования	К,О	Не требуется	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	К.О	Не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ВНД		11,15,16	Реконструкция, создание

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется принятие технических решений, их согласований на уровне компетентных организаций согласно установленных требований, принятых стандартов. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.**



ФОТО 11



ФОТО 15



ФОТО 16

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «26» октября 2026 г

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «ДС «Солнышко» с, Лорино, ЧАО. Чукотский район ул. Ленина д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		13, 14	- нет тактильной направляющей полосы, ощущаемой ногой или тростью - зона у раковины для кресла коляски не соответствует нормативу - отсутствуют опорные поручни у унитаза, в том числе откидные - зона для кресла коляски рядом с унитазом не соответствует нормативу - отсутствуют крючки для костылей	С К О	Установка тактильной направляющей полосы, ощущаемой ногой или тростью Увеличить зону у раковины для кресла коляски, установить опорные поручни у унитаза, в том числе откидные, увеличить зону для кресла коляски рядом с унитазом установить крючки для костылей	рекон струк ция
5.2	Душевая комната (в медицинском блоке)	есть			- дверной проём не соответствует нормативу - нет тактильной направляющей полосы, ощущаемой ногой или тростью - зона у душа для кресла коляски не оборудована - отсутствуют опорные поручни - имеются порожки - отсутствуют крючки для костылей		Увеличить дверной проём создать тактильную направляющую полосу, ощущаемой ногой или тростью увеличить зону у душа для кресла коляски установить опорные поручни и крючки для костылей	рекон струк ция

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			отсутствует		создание	
	ОБЩИЕ требования к зоне						реконструкция	

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		13,14	реконструкция

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется принятие технических решений, их согласований на уровне компетентных организаций согласно установленных требований, принятых стандартов. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.**



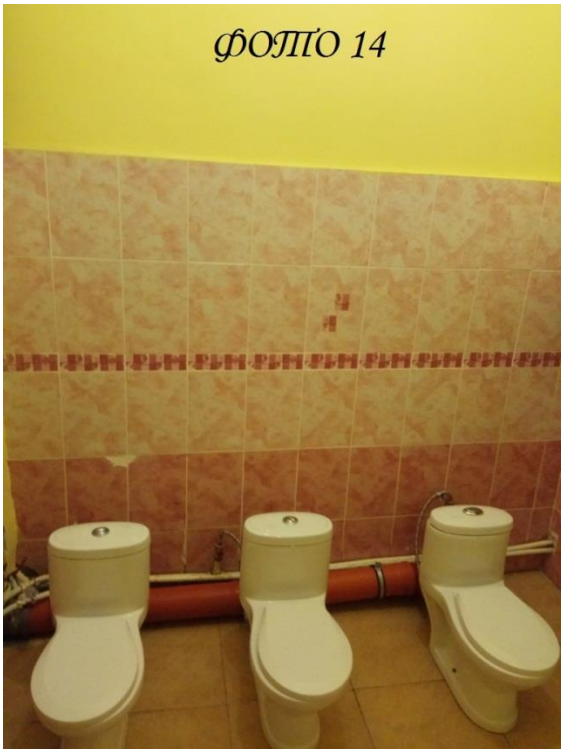

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «26» октября 2026 г

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ «ДС «Солнышко» с, Лорино, ЧАО.Чукотский район ул. Ленина д.9
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Надписи - нет Указатели, пиктограммы - нет Текстофоны (текстовые телефоны) – нет Световые текстовые табло для ввода оперативной информации - нет	С	Создание надписей указателей, пиктограмм Установка текстофонов (текстовых телефонов) световых текстовых табло для ввода оперативной информации	Прио брете ние и устан овка
6.2	Акустические средства	нет			Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 $м^{2}$ - нет Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы - нет Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами - нет Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) - нет Речевые информаторы и маяки - нет	Г	Установка звукового маяка, малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем, телефона с усилителей звука и увеличенными клавишами, речевых информаторов и маяков	устан овка
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства информации о предоставлении услуги: маркировка кабинетов	С	маркировка кабинетов приема со стороны ручки,	устан овка

					приема со стороны ручки, на кнопках управления лифта, на поручнях лестниц, на кабинах санитарно-бытовых помещений - нет		на поручнях лестниц, на кабинах санитарно-бытовых помещений	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Создание и установка визуальных, акустических, тактильных средств	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Создание и установка

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется принятие технических решений, их согласований на уровне компетентных организаций согласно установленных требований, принятых стандартов. Организация альтернативной формы оказания образовательных услуг.**
